

LEGENDA	
DESCRIZIONE	AREE [mq]
TAGLIO VEGETAZIONALE	1 109 713
AREE IN PRESENZA DI ACQUA	31 144
AREA SOGGETTA A LAVORAZIONI CHE INTERESSANO STRATI DI TERRENO AD UNA PROFONDITÀ MASSIMA DI 3 m	1016 213
AREA SOGGETTA A LAVORAZIONI CHE INTERESSANO STRATI DI TERRENO AD UNA PROFONDITÀ MASSIMA DA 3 A 5 m	12 947
AREA SOGGETTA A LAVORAZIONI CHE INTERESSANO STRATI DI TERRENO AD UNA PROFONDITÀ MASSIMA SUPERIORE AI 5 m	77 284

**LEGENDA RECINZIONI E DELIMITAZIONI**

Delimitazione costituita da montanti metallici infissi nel terreno+pannelli metallici prefabbricati + mascheramento con rete plastificata stralata rossa h = 2 mt

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109 D.Lgs. 81/2008)

LEGENDA	
Linee Elettriche B.T.	Fibra Ottica Autostrada
Linee Elettriche M.T.	Oleodotti
Linee Elettriche A.T.	OSS
Acquedotti	Ossigenodotti
GAS	
ACQUEDOTTI	
FOGNATURE	
Linee Telefoniche	
Fibra Ottica Telecom	



Area A22			
Schemi cantierizzazione	D.M. 10/07/02	Recinzioni	
1 A22		Q.tà (m)	
Cantiere infrastrutturale	-	940 ml	

Area A49e			
Schemi cantierizzazione	D.M. 10/07/02	Recinzioni	
1 A49e		Q.tà (m)	
Cantiere infrastrutturale	-	1310 ml	

Area A49c			
Schemi cantierizzazione	D.M. 10/07/02	Recinzioni	
1 A49c		Q.tà (m)	
Cantiere infrastrutturale	-	1055 ml	

Area A23a			
Schemi cantierizzazione	D.M. 10/07/02	Recinzioni	
1 A23a		Q.tà (m)	
Cantiere infrastrutturale	-	985 ml	

Area A49d			
Schemi cantierizzazione	D.M. 10/07/02	Recinzioni	
1 A49d		Q.tà (m)	
Cantiere infrastrutturale	-	995 ml	

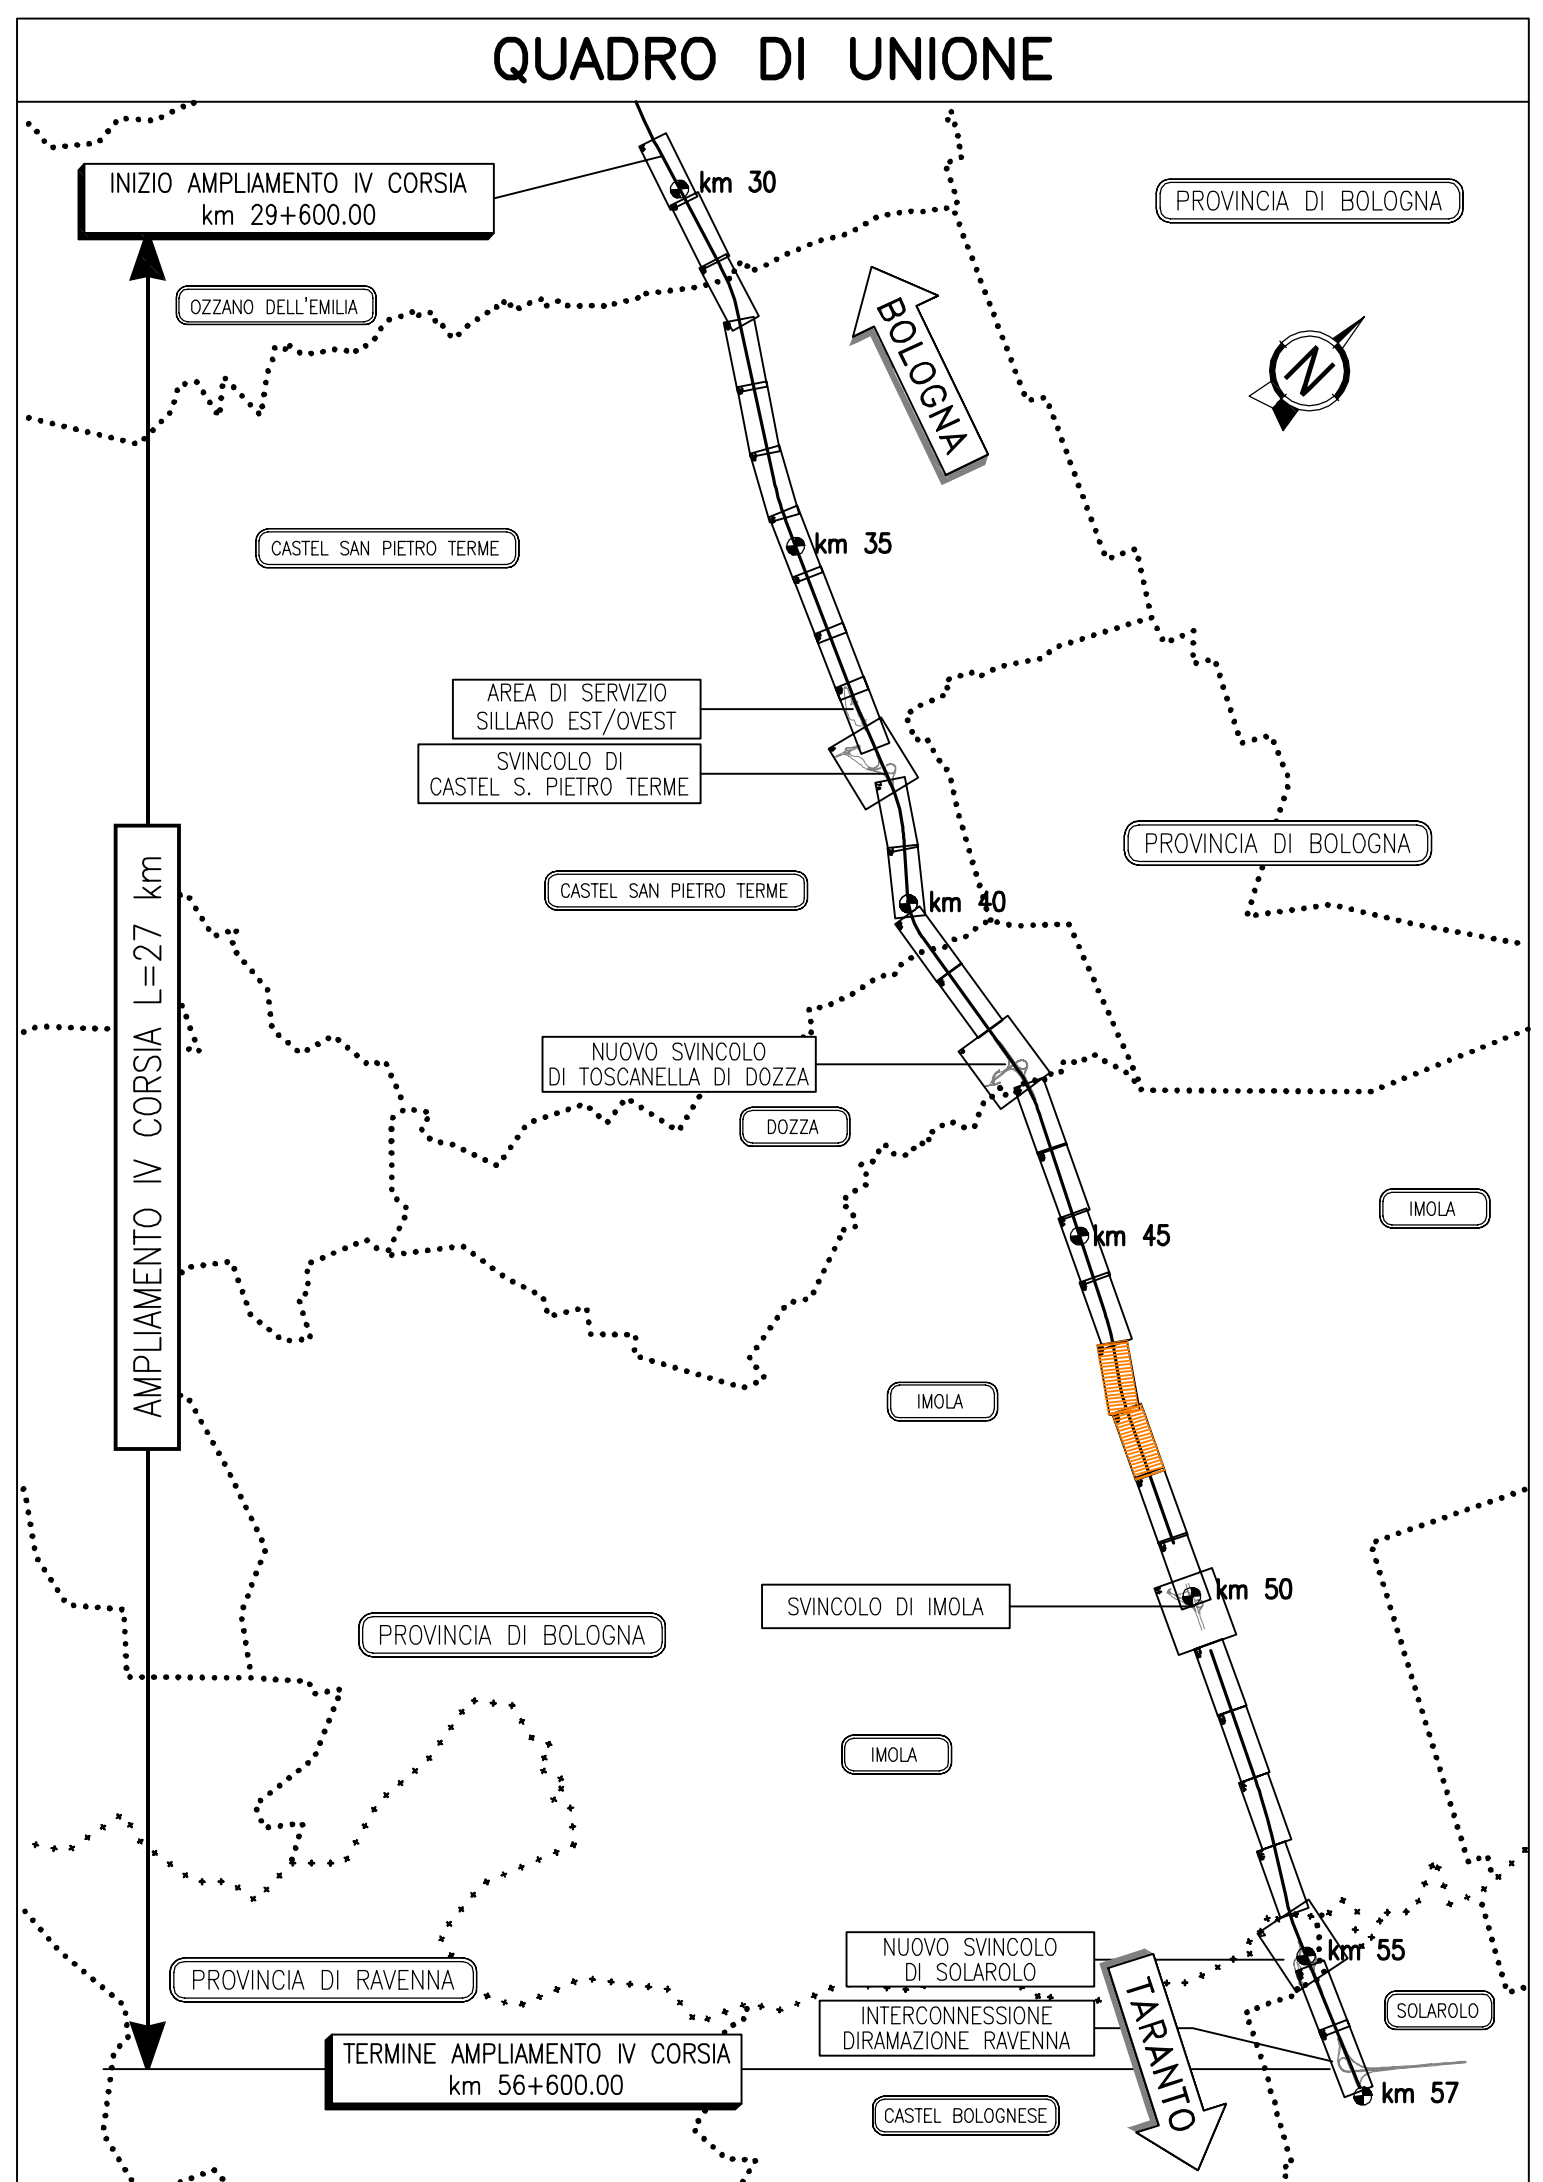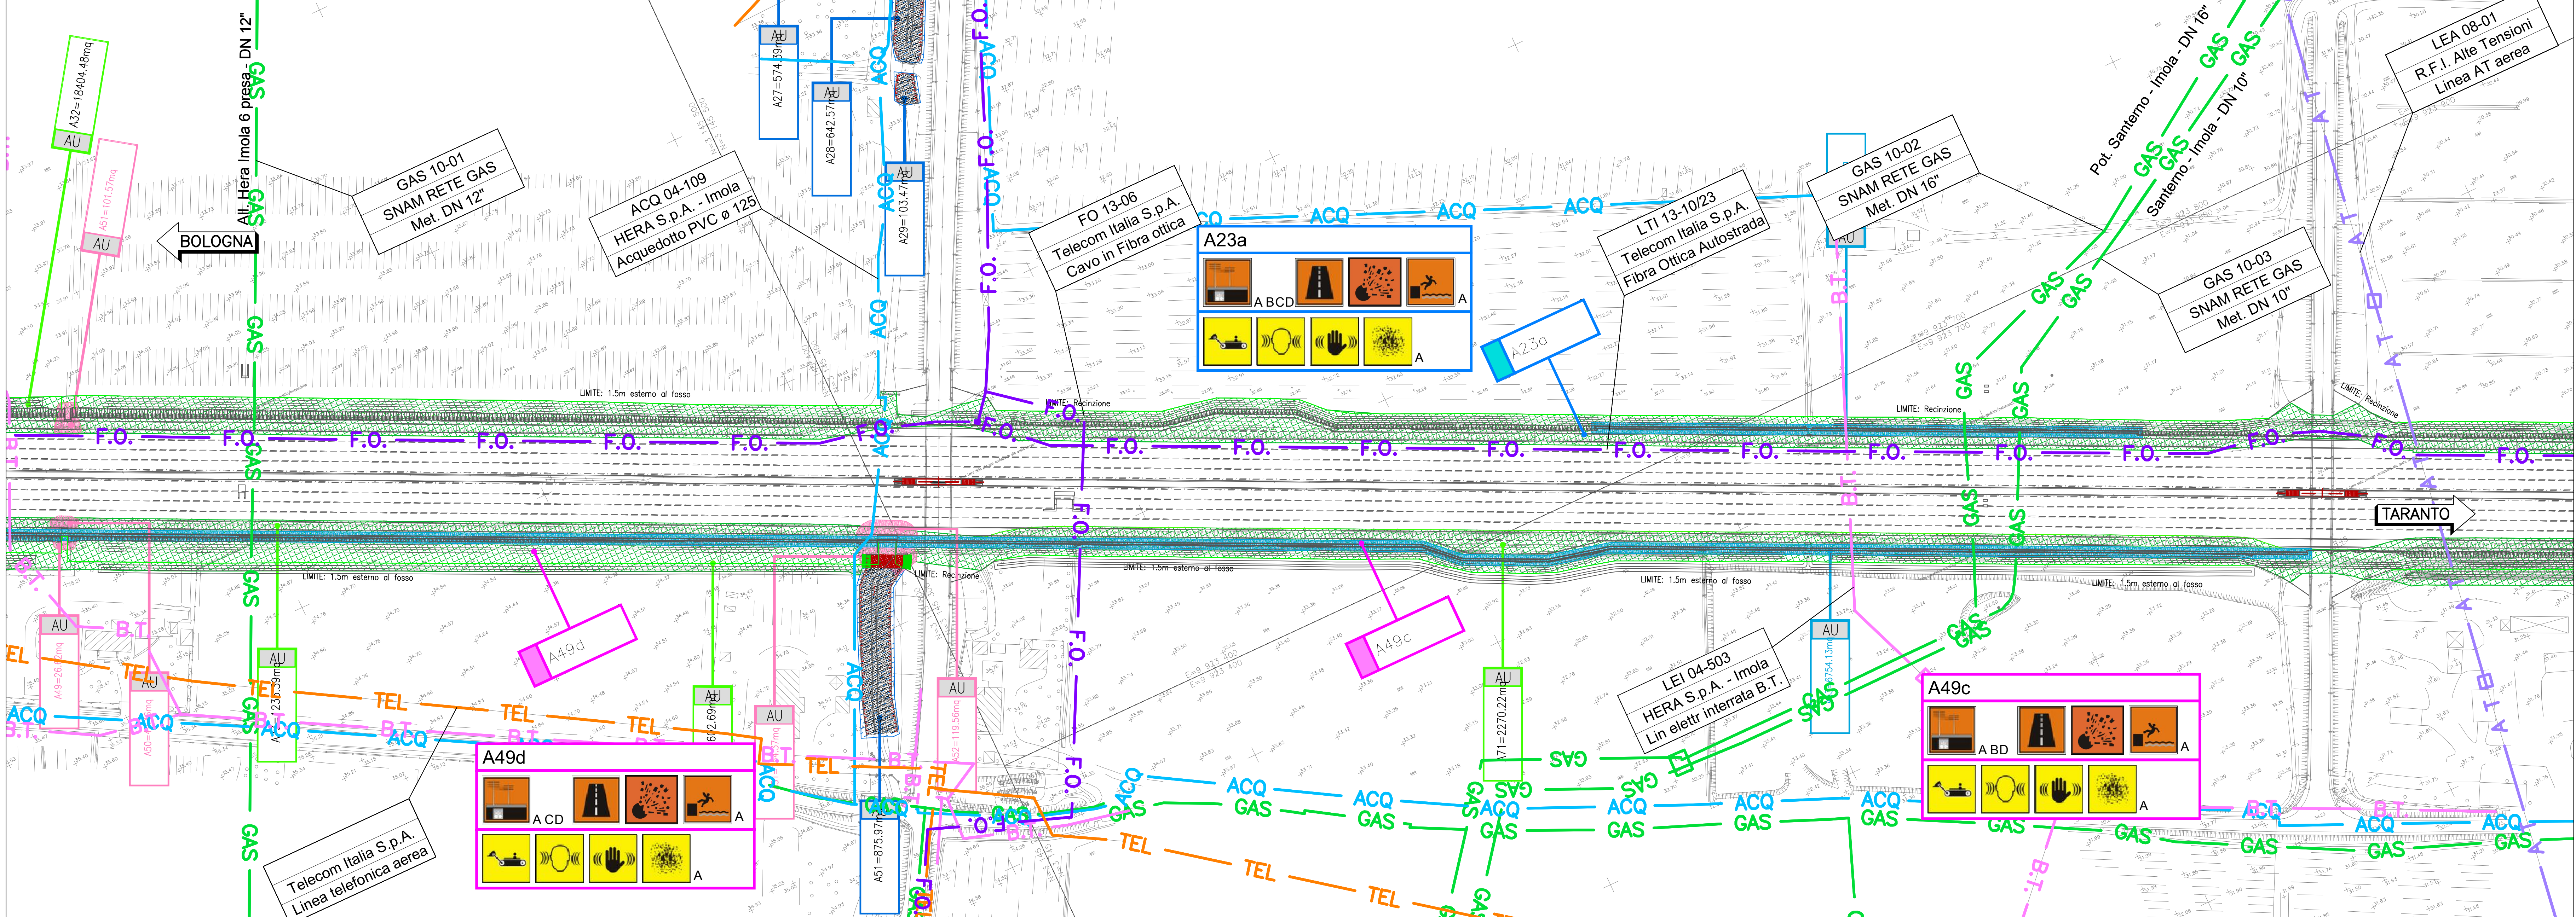

RIF	DESCRIZIONE	RIF PSC	Specifica	Simbolo
D.Lgs 81/08 All.XV 2.2.1	protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area di cantiere di condutture aeree e sotterranee	C.3.2.1	A. Linee aeree e condutture interrare interferenti B. Linee non interferenti C. Linee potenzialmente interferenti D. Sono presenti condutture sotterranee non interferenti	A B C D
b.	rischio di annegamento	C.3.2.2	A. Attività nei pressi di corsi d'acqua o bacini di profondità <1,5 m B. Attività nei pressi di corsi d'acqua o bacini di profondità >1,5 m C. Natanti o mezzi anfibi D. Alvei di corsi d'acqua di portata rilevante	A B C D
c.	lavorazioni stradali e autostradali, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti del traffico circostante	C.3.2.3		
d.	cantiere in ambito ferroviario	C.3.3.1		
e.	rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo	C.3.3.2		
f.	rischi derivanti da particolari situazioni geologiche	C.3.3.3		
g.	rischi di natura idraulica	C.3.3.4		
h.	rischi derivanti da terreni contaminati	C.3.3.5		
i.	presenza di industrie pericolose o a rischio incidente rilevante	C.3.3.6		
l.	presenza di manufatti o di cantieri archeologici	C.3.3.7		
m.	lavori in ambienti confinati	C.3.3.8		
n.	transito di mezzi da e per il cantiere	C.3.4.1		
o.	rumore, vibrazioni, rifiuti e scarichi di acque superficiali	C.3.4.2		
p.	polveri, vapori o nebbie	C.3.4.3	A. Generalità B. Trattamento a calce o a cemento	A B

**LEGENDA**

Apprestamenti igienico assistenziali (locale riposo e ricovero e wc chimico con lavandino)

Accesso area di lavoro

**NOTE:**

- i costi della sicurezza derivanti dall'analisi dei fattori di rischio da/per il cantiere sono riportati nell'elaborato SIC0002
- i costi della sicurezza derivanti dalle misure preventive/protezione e le prescrizioni da applicare sulla base dell'analisi dei rischi legati all'esecuzione dei lavori sono riportati all'interno dell'elaborato SIC0002
